

An die Anwohnerinnen und Anwohner
sowie Verwaltungen oder Betriebe
an der Lärchenstrasse / Stöckenstrasse
8903 Birmensdorf

19. Juni 2023/he

Ersatz Werkleitungen Lärchenstrasse / Lärchenweg

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Im Auftrag der Gemeinde Birmensdorf informieren wir Sie über den Ersatz der Werkleitungen (Wasser, Kanal und Stromversorgung) auf einer gesamten Länge von 750m' im Lärchenweg und der Lärchenstrasse.

Die Ausführung wird in fünf Bauphasen stattfinden. Dies ermöglicht die Verkehrsführung einseitig im Gegenverkehr in den jeweiligen Bauphasen und die Erschliessung der Liegenschaften in der Sackgasse.

Die Bauphasen und die betroffenen Abschnitte sind auf der Rückseite dargestellt.

Baubeginn:	ab Montag, 26. Juni 2023 im Lärchenweg
Bauende Werkleitungsbau:	ca. Mitte November 2023
Bauende Strassenbau:	ca. Mitte Dezember 2023
Einbau Deckbelag:	ca. Sommer 2024

Während den Grab- / Verlegearbeiten ist die Durchfahrt in der Lärchenstrasse für den Anwohnerverkehr gewährleistet. Im Baubereich wird es evtl. zu kurzen Wartezeiten kommen.

Die betroffenen öffentlichen Parkplätze werden während der jeweiligen Etappe gesperrt sein.

Aktuell gehen wir mit folgenden Bauphasen aus:

<u>Etappe 1:</u> Lärchenweg – Wasser/EKZ	26. Juni 2023 – 24. Juli 2023
<u>Etappe 2:</u> Zürcherstr. bis Lärchenstr. 6a – Wasser/EKZ	17. Juli 2023 – 18. Sep. 2023
<u>Etappe 3.1:</u> Lärchenstr. Haus 6a bis 20 – Kanal	3. Juli 2023 – 11. Sep. 2023
<u>Etappe 3.2:</u> Lärchenstr. Haus 6a bis 20 – Wasser/EKZ	12. Sep. 2023 – 25. Okt. 2023
<u>Etappe 4:</u> Lärchenstr. 32 bis Haus 20 – Wasser/EKZ	19. Sep. 2023 – 8. Nov. 2023
<u>Etappe 5:</u> Einbau Deckbelag gesamter Perimeter	Sommer 2024

Wir bitten Sie, die Signalisationen und Abschränkungen zu beachten und im Baustellenbereich keine Fahrzeuge abzustellen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir vorab um Ihr Verständnis

Zertifiziert nach der ISO Norm 9001:2015



und danken für Ihre Rücksichtnahme. Wir sind bemüht darum, die Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten.

Die einzelnen Bauphasen können je nach Witterung oder Unvorhergesehenem noch verschoben werden. Wir werden Sie selbstverständlich wieder über die weiteren Verschiebungen oder Sperrzeiten informieren.

Wir bitten Sie für diese unumgänglichen Massnahmen um Verständnis. Für Auskünfte im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehe ich Ihnen gerne ab dem 26. Juni 2023 unter Tel. 043 500 45 89 oder roger.hersche@landis-ing.ch zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Roger Hersche
Bauleiter

Mitteilung an:

- Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
- Rettungsdienst Spital Limmattal
- Bader Transporte AG, Regensdorf
- Gemeinde Birmensdorf

Etappe 1:

Dauer: 26. Juni 2023 – 24. Juli 2023



BITTE BEACHTEN SIE DIE RÜCKSEITE


Etappe 2:

Dauer: 17. Juli 2023 – ca. 18. September 2023




Etappe 3.2:

Dauer: 12. September 2023 – ca. 25. Oktober 2023

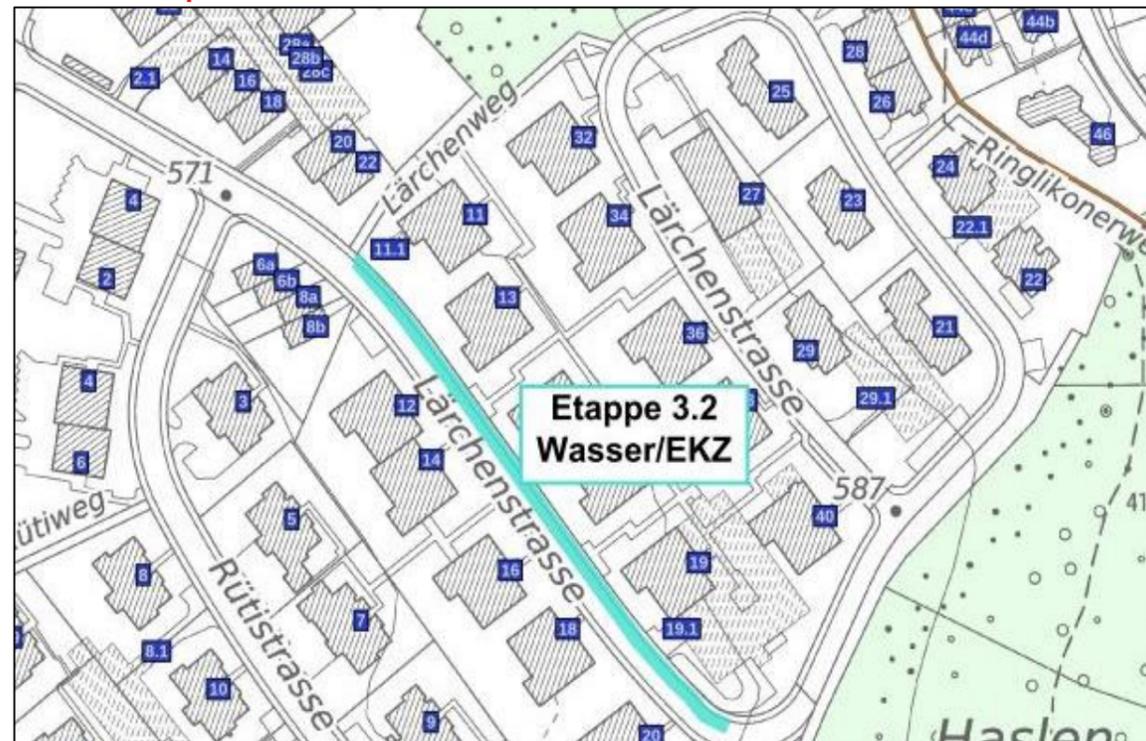


Etappe 3.1:

Dauer: 3. Juli 2023 – ca. 11. September 2023

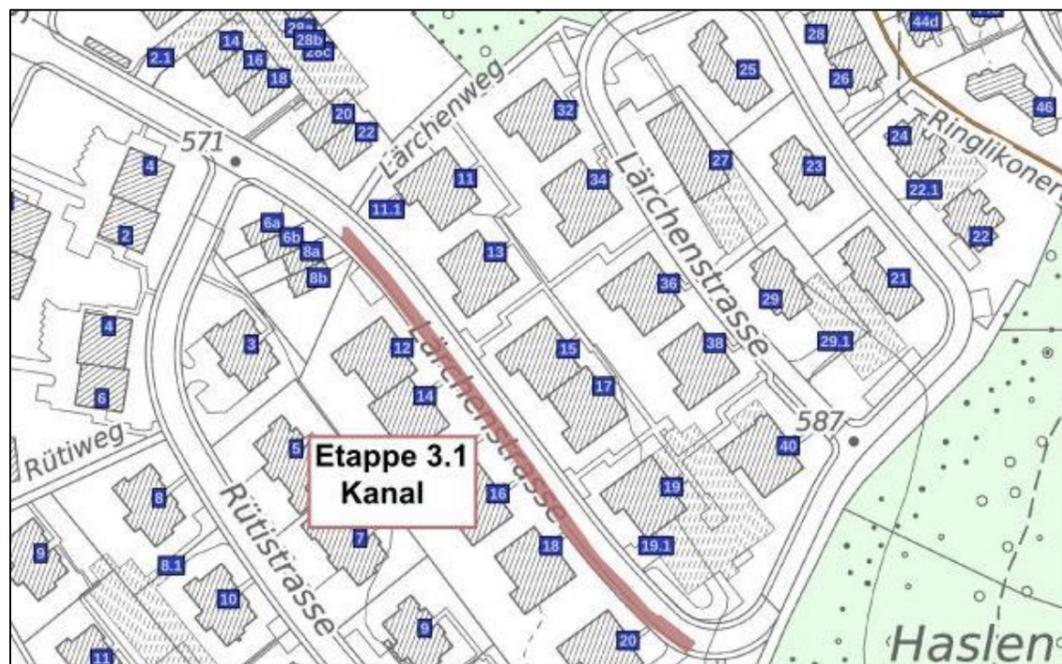

Etappe 4:

Dauer: 9. September 2023 – ca. 8. November 2023

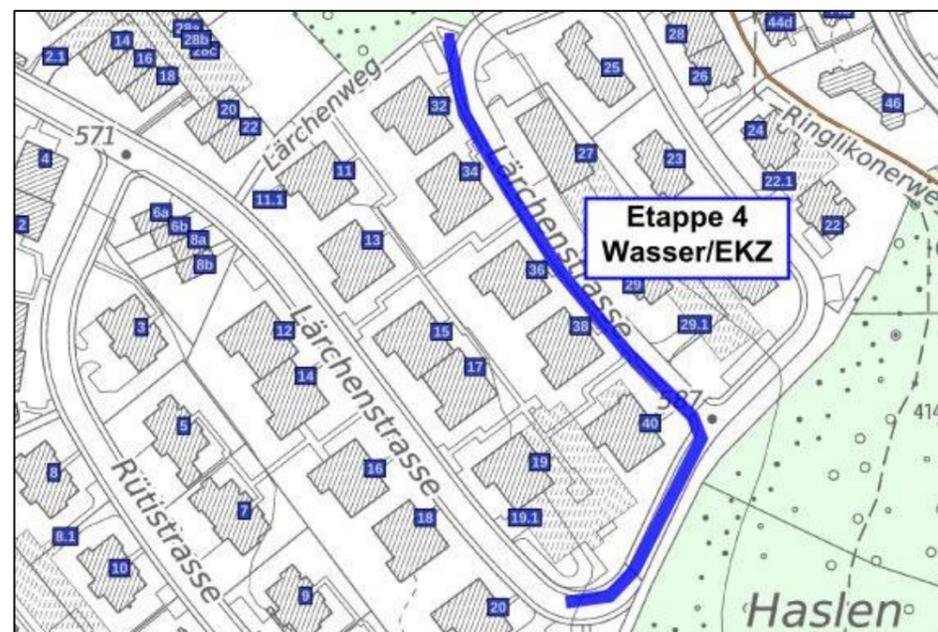

Etappe 5:

Im Sommer 2024 erfolgt der Einbau vom Deckbelag im gesamten Projektperimeter.

Zertifiziert nach der ISO Norm 9001:2015

